



Fortschrittsbericht Baumaßnahmen an Schulen und Sportstätten

Stand: Januar 2019

Friedrich-Wilhelm-v.-Steuben Gesamtschule (46)

Brandschutzsanierung



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	50	30	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juli 19	Dez. 20	in Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Projektumfang: Brandschutz- und Gebäudesanierung,
Umgestaltung der Außenanlagen
Sanierung Turnhalle, Errichtung einer temp. Containeranlage



Grundschule Am Kirchsteigfeld (56)

Brandschutzsanierung



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	95	95	45

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juni 18	Dez. 19	in Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Brandschutzsanierung erfolgt abschnittsweise:
2. BA Gebäude ab Februar 2019.



Schulstandort Gagarinstraße (GES29)

Gesamtschule mit Primarstufe und Hort und Errichtung 4-Feld-Sporthalle



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	93	80	65	67

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Okt. 16	Neubau März 19 Altbau Sommer 20	Apr. 19

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Turnhalle Fertigstellung April 19, Nutzung Mai/ Juni 19



Grundschule Bornim

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort

Projektfortschritt



LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	98	99	99	78

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Jul. 19	Schuljahr 19/20

Bemerkung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	



Grundschule Bornstedter Feld

Neubau 3-zügige Grundschule mit Hort und Turnhalle



Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Schule	100	100	100	100	95	80	80	55

Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Schule	Okt. 17	Dez. 19	Winterferien 20

Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Schule		

Bemerkung



Motorsporthalle (21)

Sanierung

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	100

Zeitplan


Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mai 16	Dez. 18	in Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
●	●

Bemerkung

Maßnahme abgeschlossen

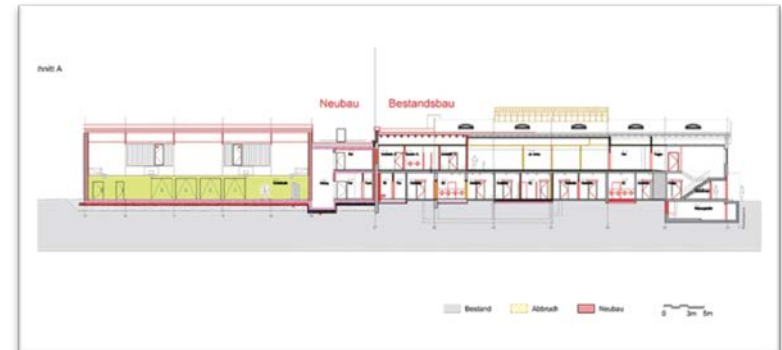

Schilfhofschule (49)

Sanierung und Erweiterung

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	99

Zeitplan



Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 16	Dez. 18	Feb. 19

Bemerkung

Bauaufsichtliche Abnahmen am 16.01.19. Vollständige Innutzunahme Gebäude ab 01.02.19.

Letzter Abschnitt Außenanlagen (Stadtkontor) Mai/ Juni 19.

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	



Turnhalle & Außensportanlage Gym. Haeckelstraße (5)

Neubau Turnhalle und Kleinspielfeld, Außensportanlagen


Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Turnhalle	100	100	100	100	85	50	50	8
Spielfeld	100	100	100	100	100	100	100	100
Sportanl.	100	100	100	100	70	0	0	0



Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Turnhalle	Aug. 18	Ende 19	Ende 19
Spielfeld	März 18	Juli 18	in Nutzung
Sportanlage	Frühjahr 19	Frühjahr 20	Frühjahr 20

Bemerkung



Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	





Sportplatz Golm – Kuhforter Damm

Neubau Kunstrasenplatz als Ersatzbelag für Naturrasenplatz

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	0	100	100	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juni 19	Okt. 19	Ende 19

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung



Sportplatz Lerchensteig

Neubau Sportanlage

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	80	100	75	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juni 19	Okt. 19	Ende 19

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung



Schulsportplatz Hans-Sachs-Str.

Sanierung Schulsportplatz

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	95	90	90	80

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juli 18	07.12.18	Dez. 18

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

Fertigstellung Platz Nov. 18,
Erschließung/ Sanitär im Frühjahr 2019.



Grundschule Fahrland

Erweiterung Bestandsgebäude

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	90	80	20	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
März 2019	Juli 2019	August 2019

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung
